

Projectrapportage

(voortgangsrapportage)

Opbrengst prognose
100,0K




Kosten prognose
80,0K

Marge prognose
20,0K

Stand van zaken bij aanvang

Toelichting:
- Opbrengsten (= facturatie) en kosten conform budget ofwel voorcalculatie. Respectievelijk 100k en 80k.
- Marge (budget) gelijk aan 20k
- Krapte in cashflow verwacht van 0,5k. Totale cashflow (20k).

NB: Ten behoeve van kasstroom is betalingstermijn debiteuren & crediteuren beide gesteld op 30 dagen. BTW niet meegenomen

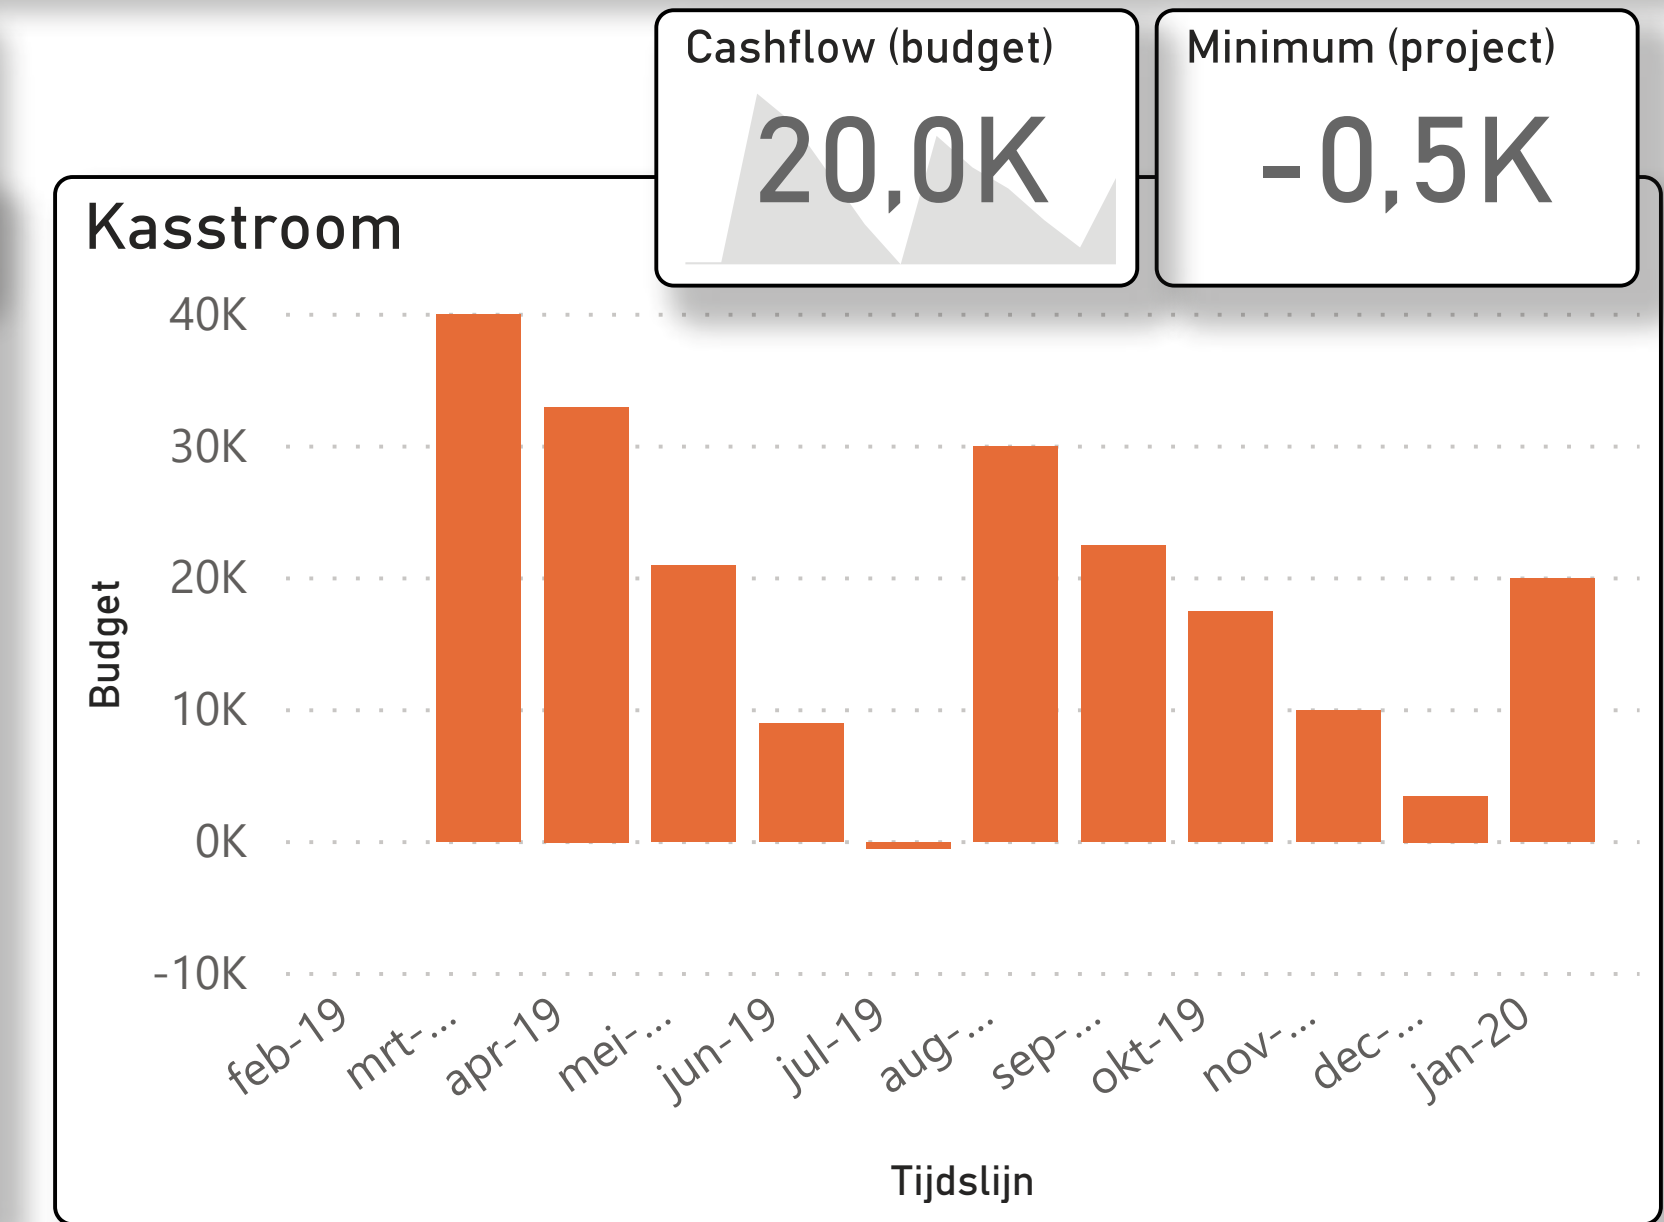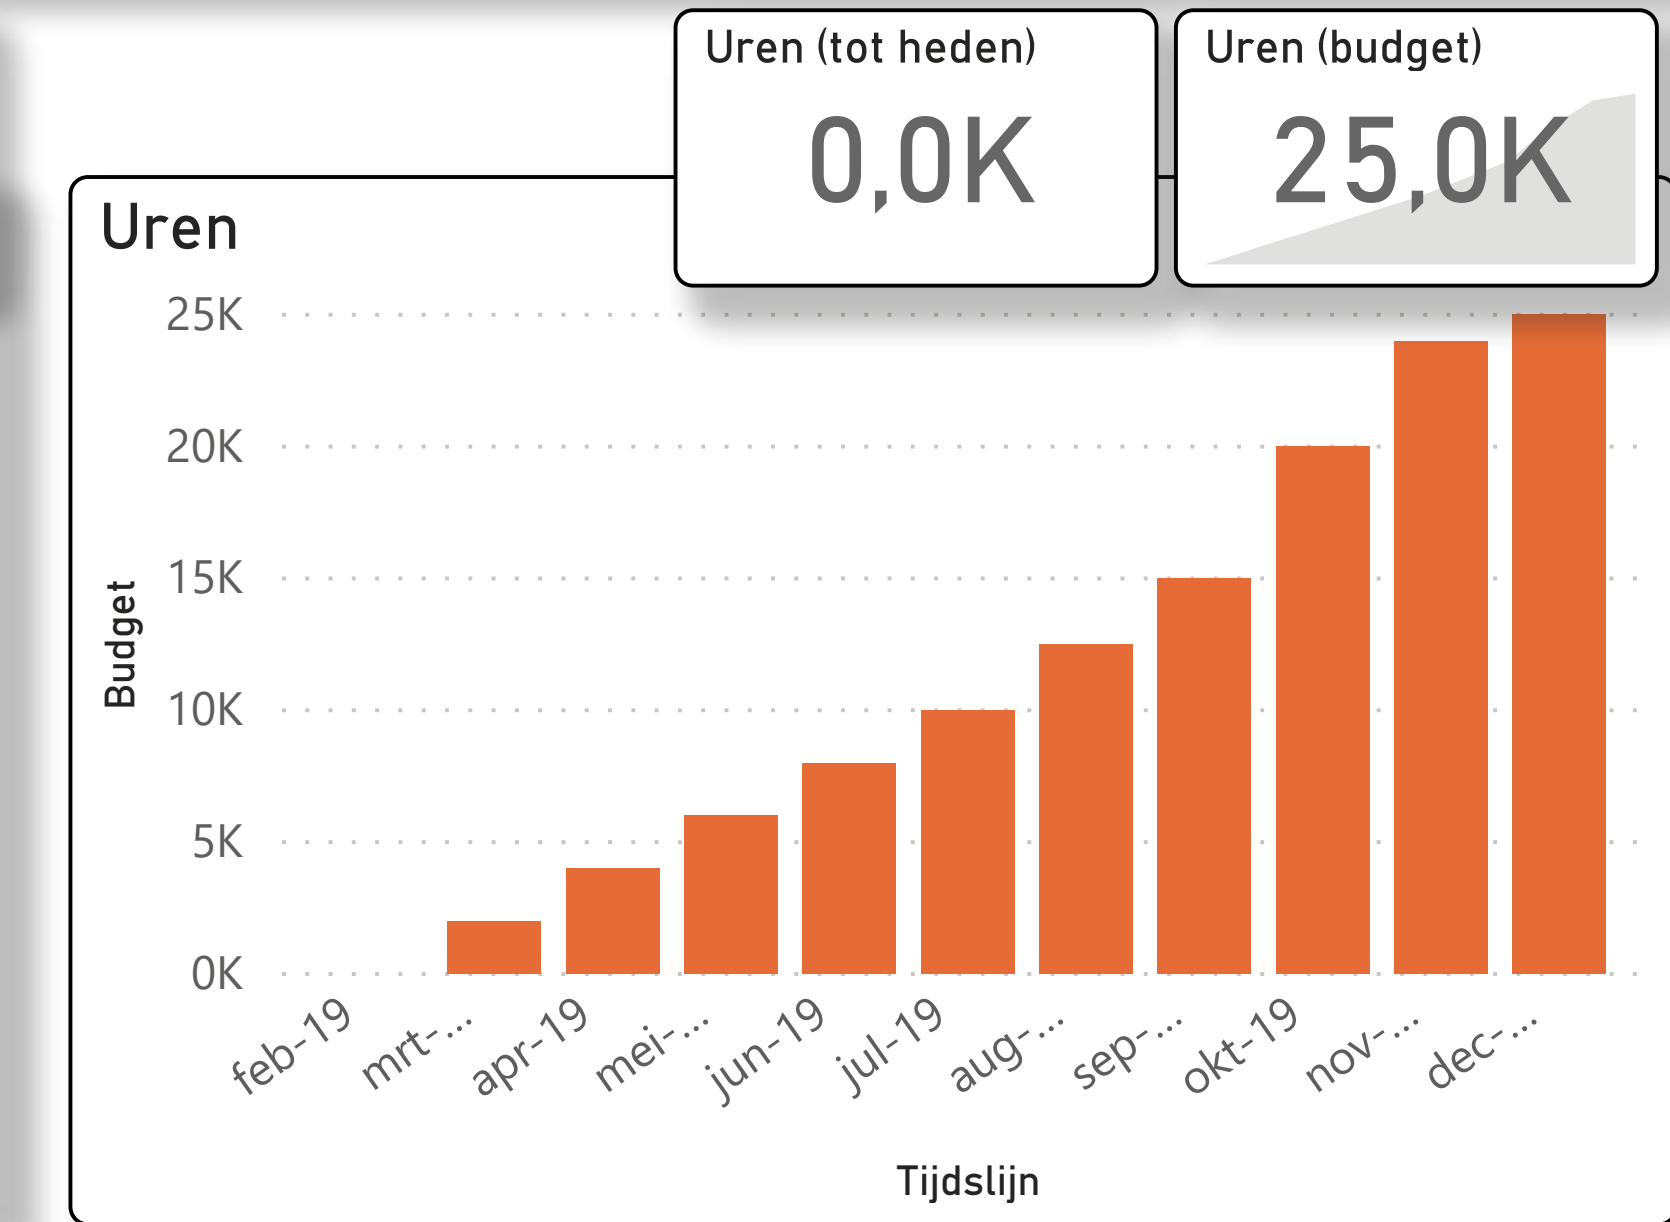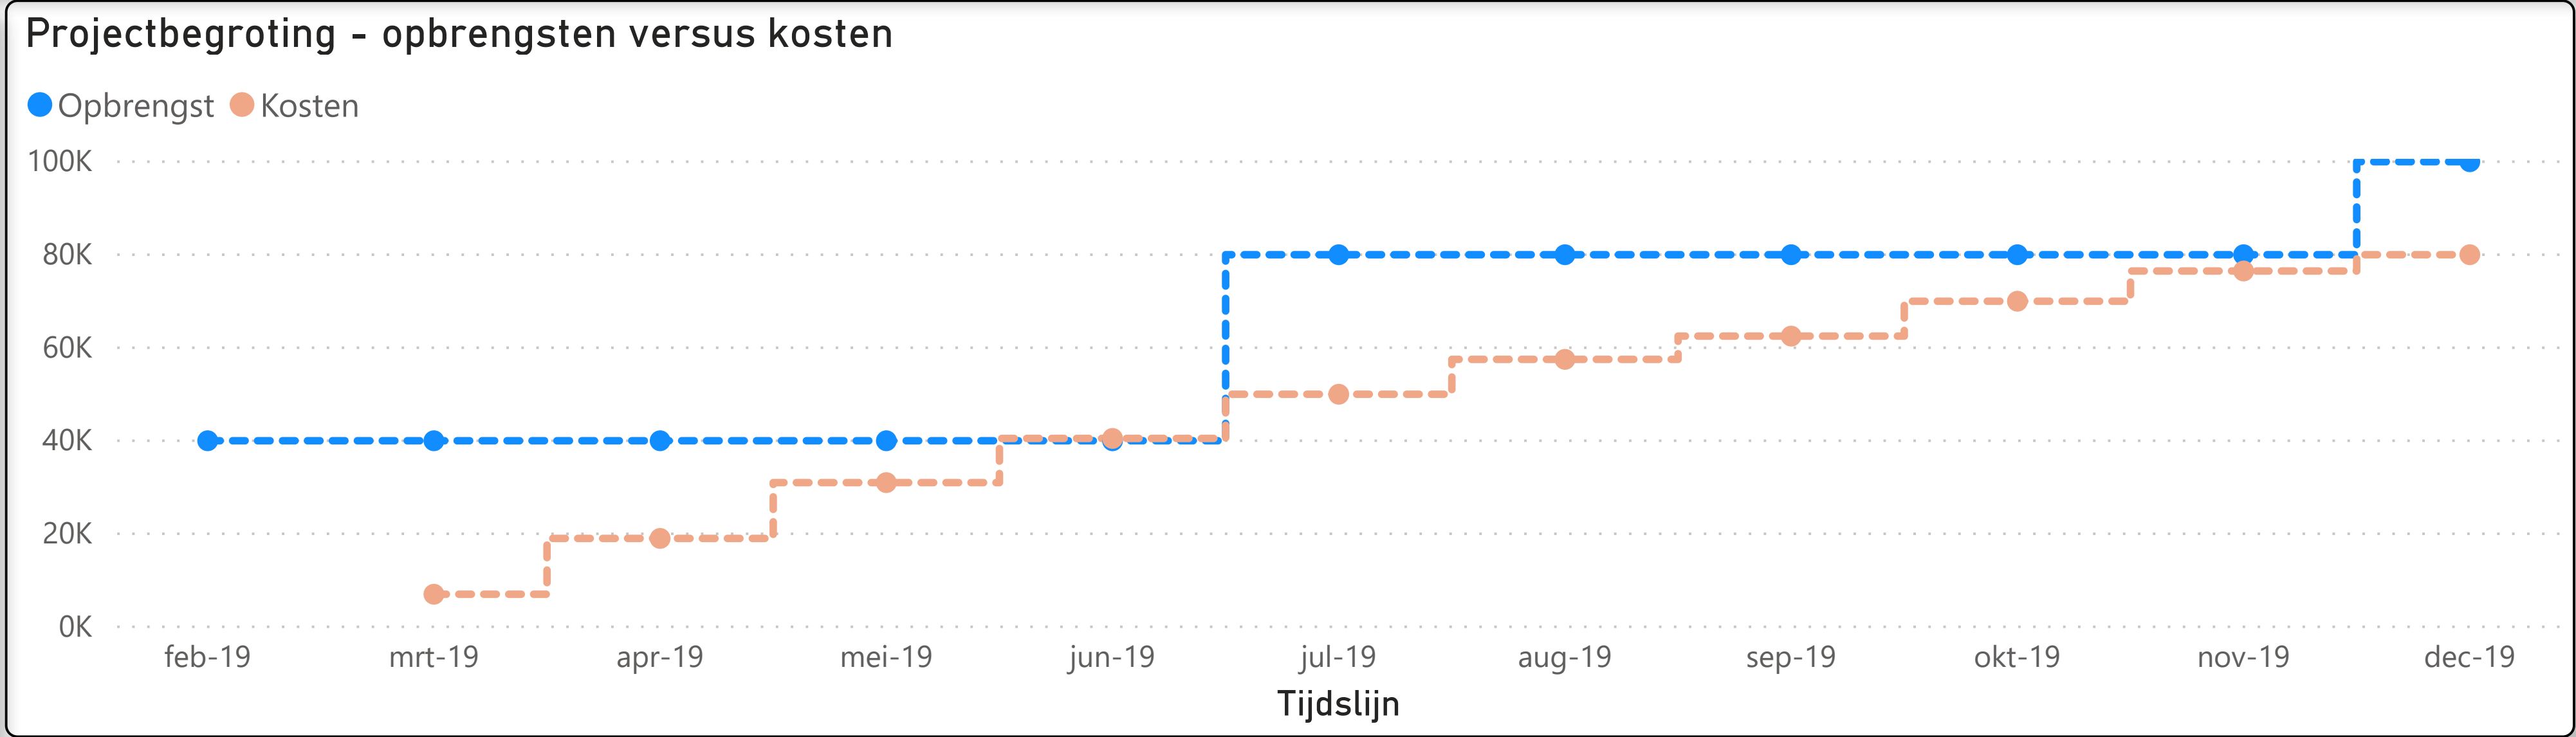

Projectrapportage

(voortgangsrapportage)

Opbrengst prognose

100,0K

Budget: 100,0K (+0%)

Kosten prognose

80,0K

Budget: 80,0K (+0%)

Marge prognose

20,0K


Budget: 20,0K (+0%)

Stand van zaken na 4 maanden

Toelichting:

- Facturatie (opbrengst) conform budget. Prognose eveneens conform budget.
- Geboekte kosten 4,5k hoger dan budget. Kostenprognose vooralsnog niet bijgesteld.
- Marge zal naar verwachting op budget uitkomen.
- Kapitaalbehoefte conform budget.

Update opbrengsten versus kosten

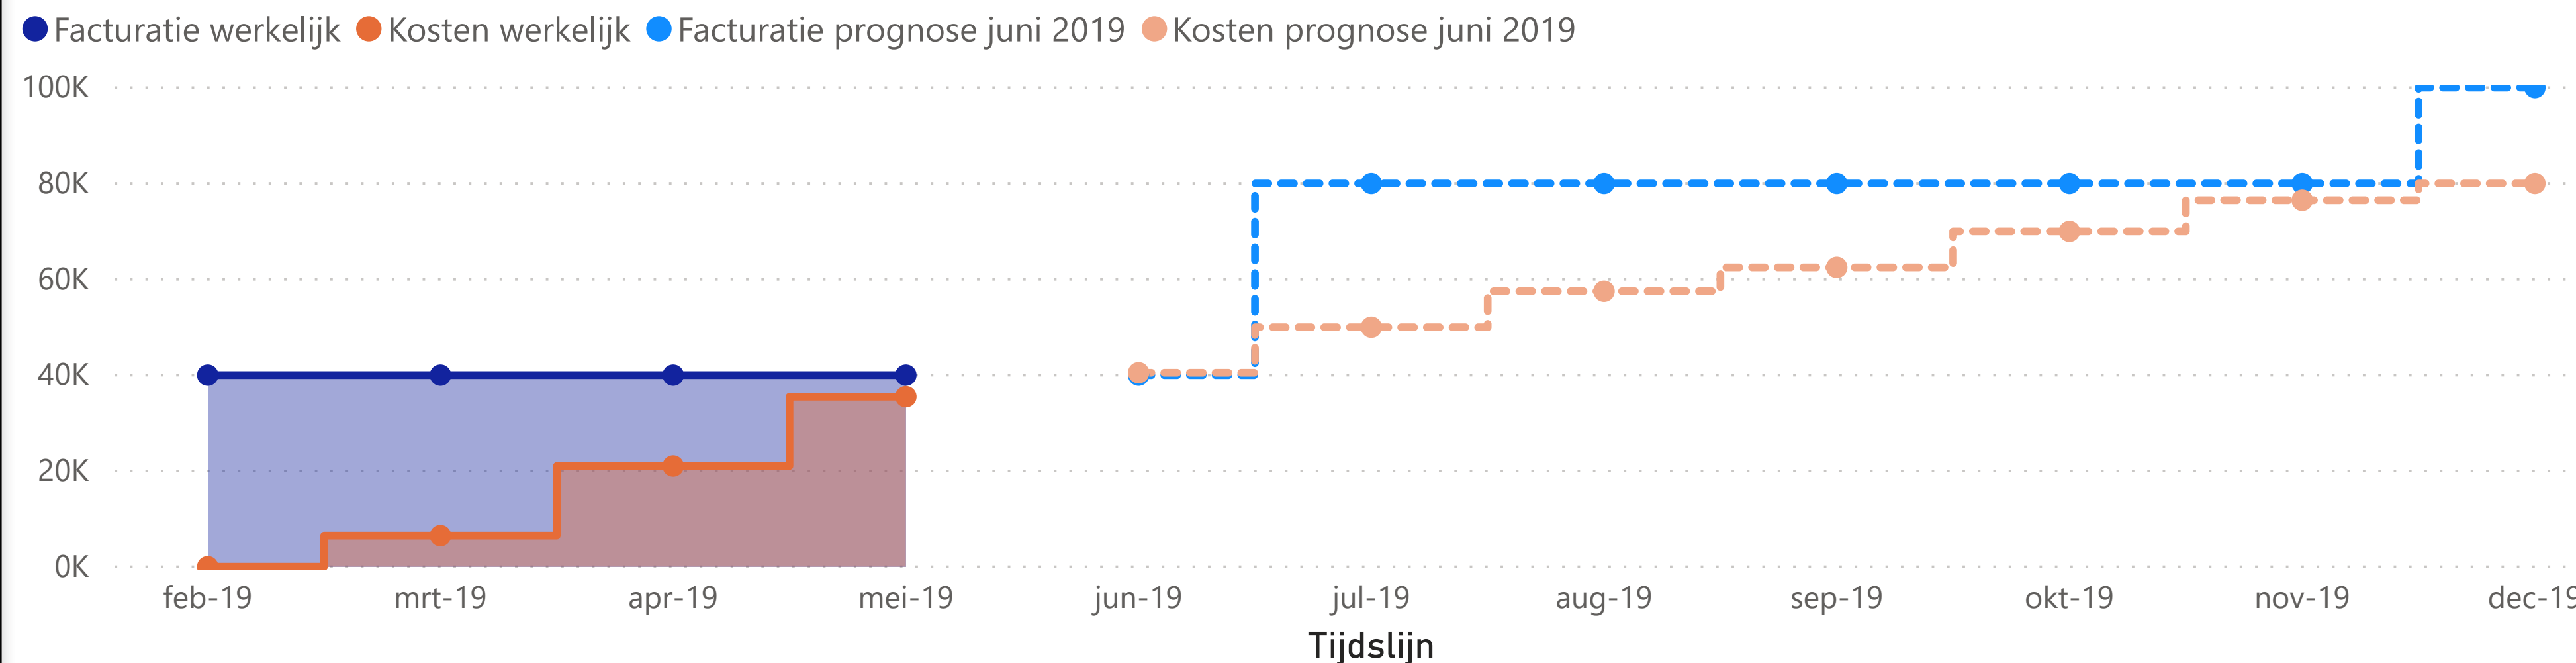

Materiaal (tot heden)

29,9K

Budget: 25,0K (-19.5%)


Materiaal (prognose)

55,0K

Budget: 55,0K (+0%)

Materiaal

● Budget ● Werkelijk ● Prognose

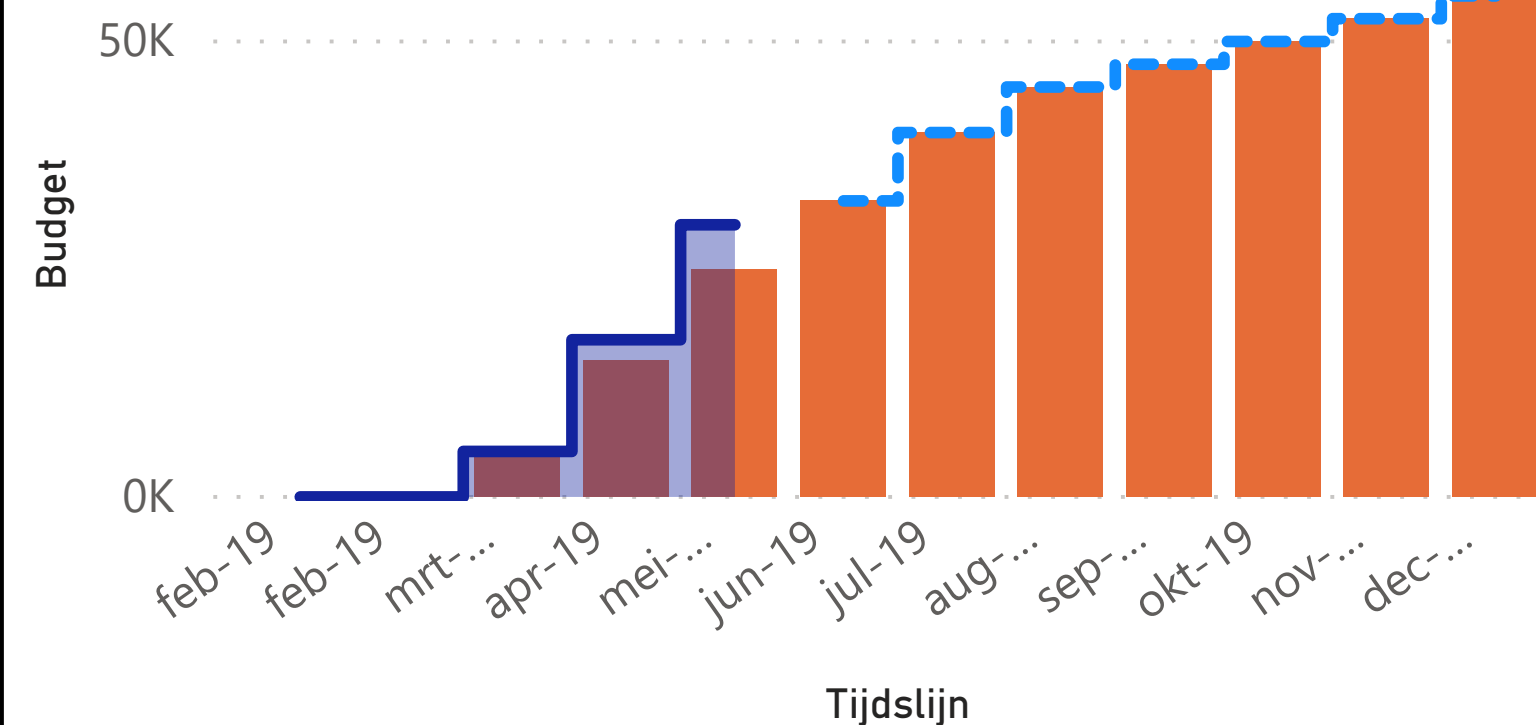

Uren (tot heden)

5,6K

Budget: 6,0K (+6.33%)


Uren (prognose)

25,0K

Budget: 25,0K (+0%)

Uren

● Budget ● Werkelijk ● Prognose

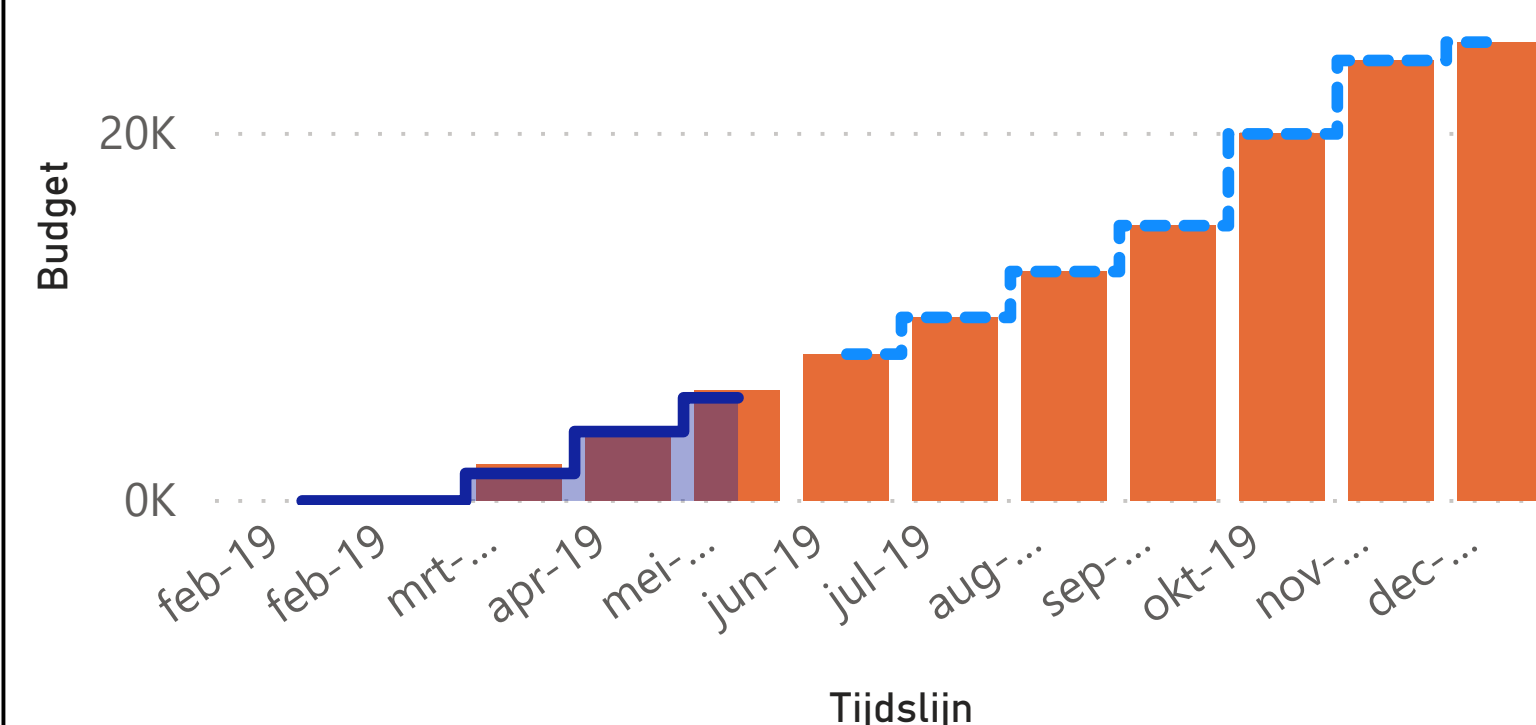

Cashflow (prognose)

20,0K

Budget: 20,0K (+0%)


Minimum (project)

-0,5K

Budget: -0,5K (+0%)

Kasstroom

● Budget ● Werkelijk ● Prognose

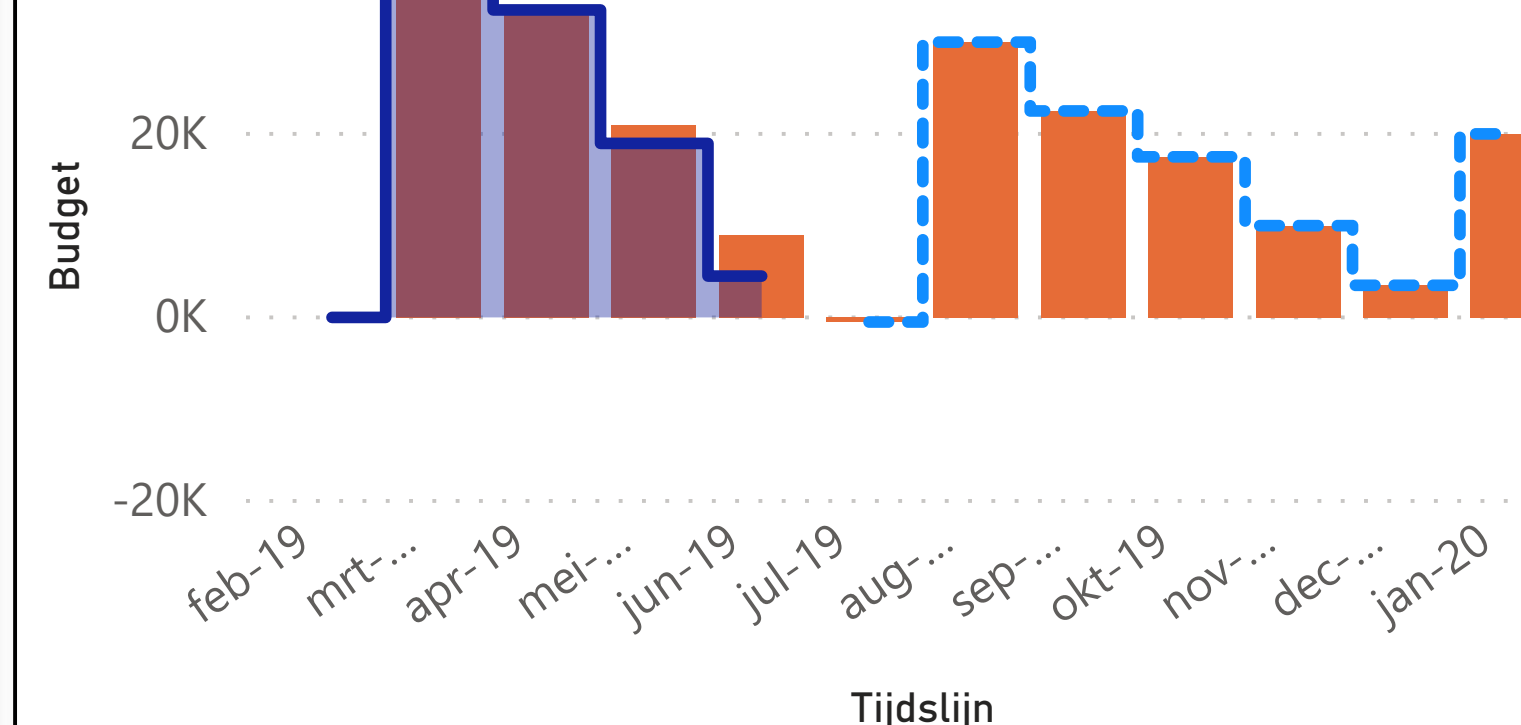

Projectrapportage

(voortgangsrapportage)

Opbrengst prognose
100,0K
Budget: 100,0K (+0%)





Kosten prognose
85,0K
Budget: 80,0K (+6.25%)

Marge prognose
15,0K
Budget: 20,0K (-25%)

Stand van zaken na 7 maanden

Toelichting:

- Facturatie (opbrengst) conform budget. Prognose eveneens conform budget. Discussie over meerwerk.
- Geboekte kosten ruim 5k hoger dan budget. Kostenprognose bijgesteld naar 85k.
- Marge zal zonder meerwerk naar verwachting 5k onder budget uitkomen.
- Kapitaalbehoefte gestegen van 0,5k naar 3k.

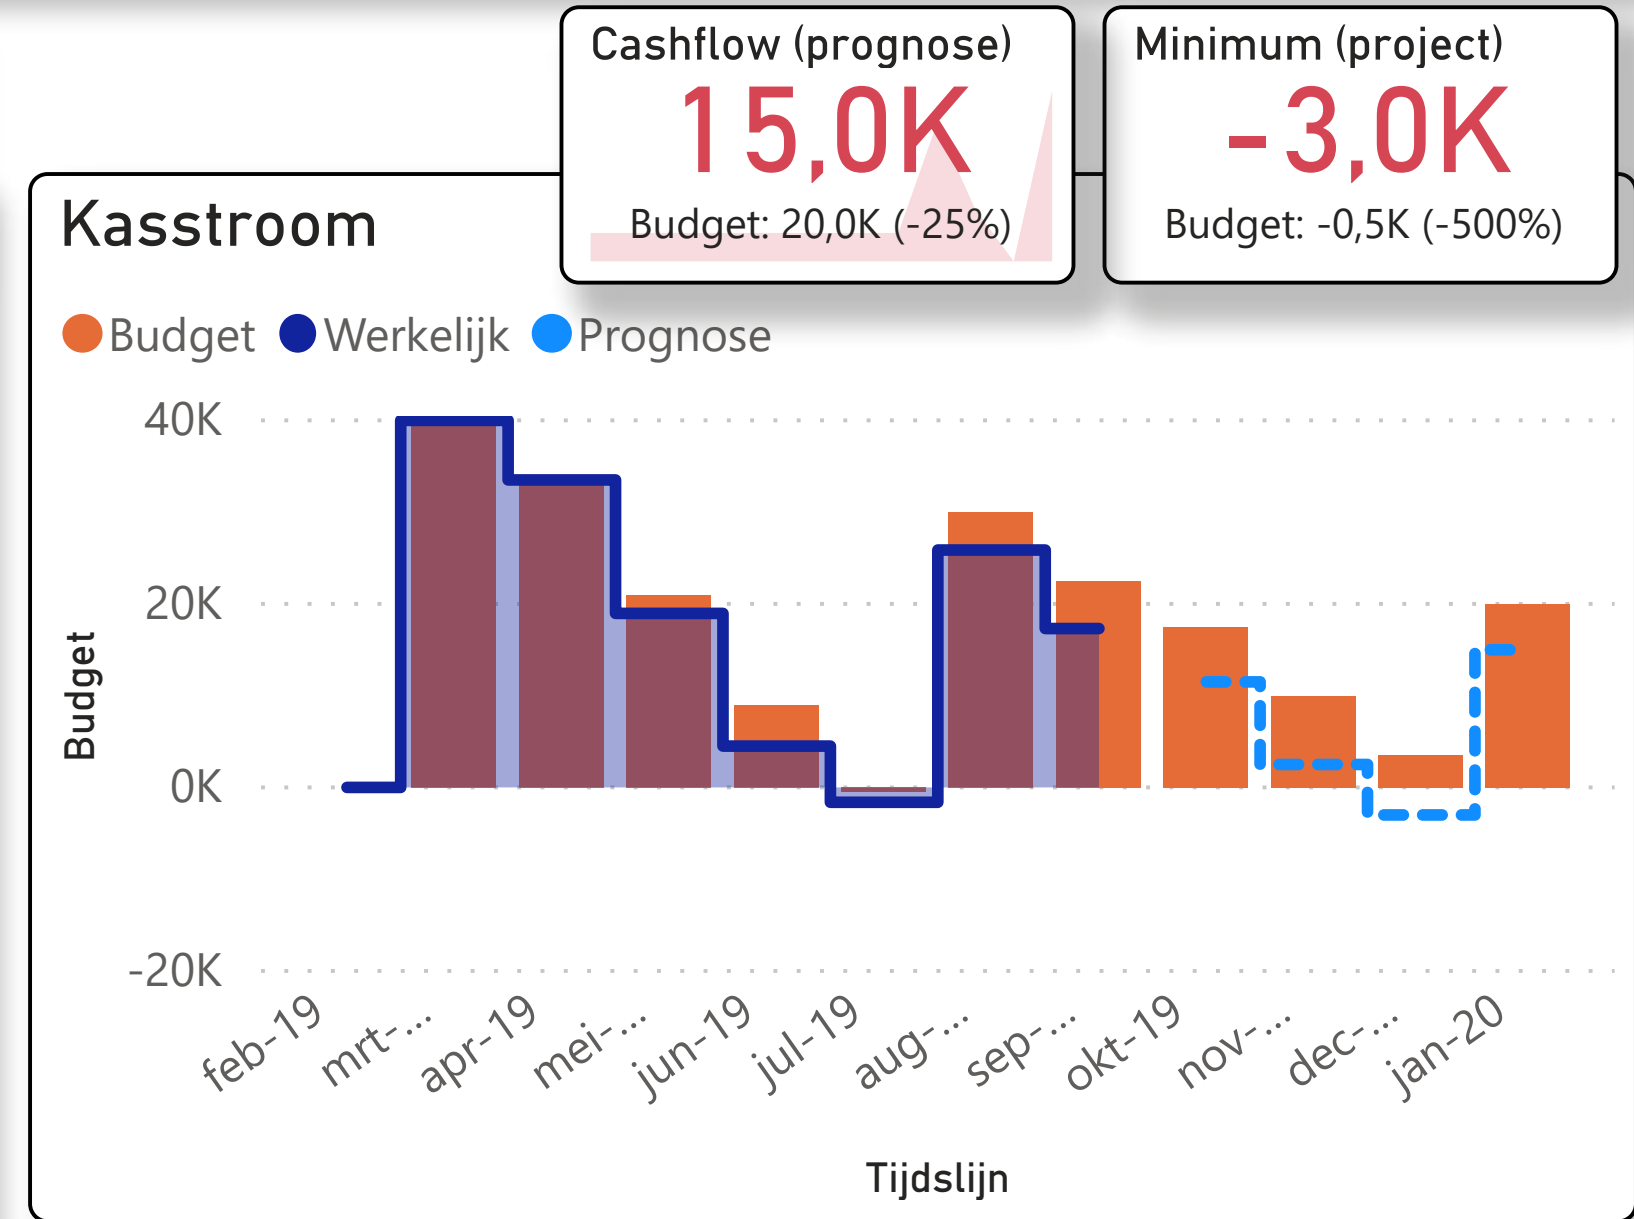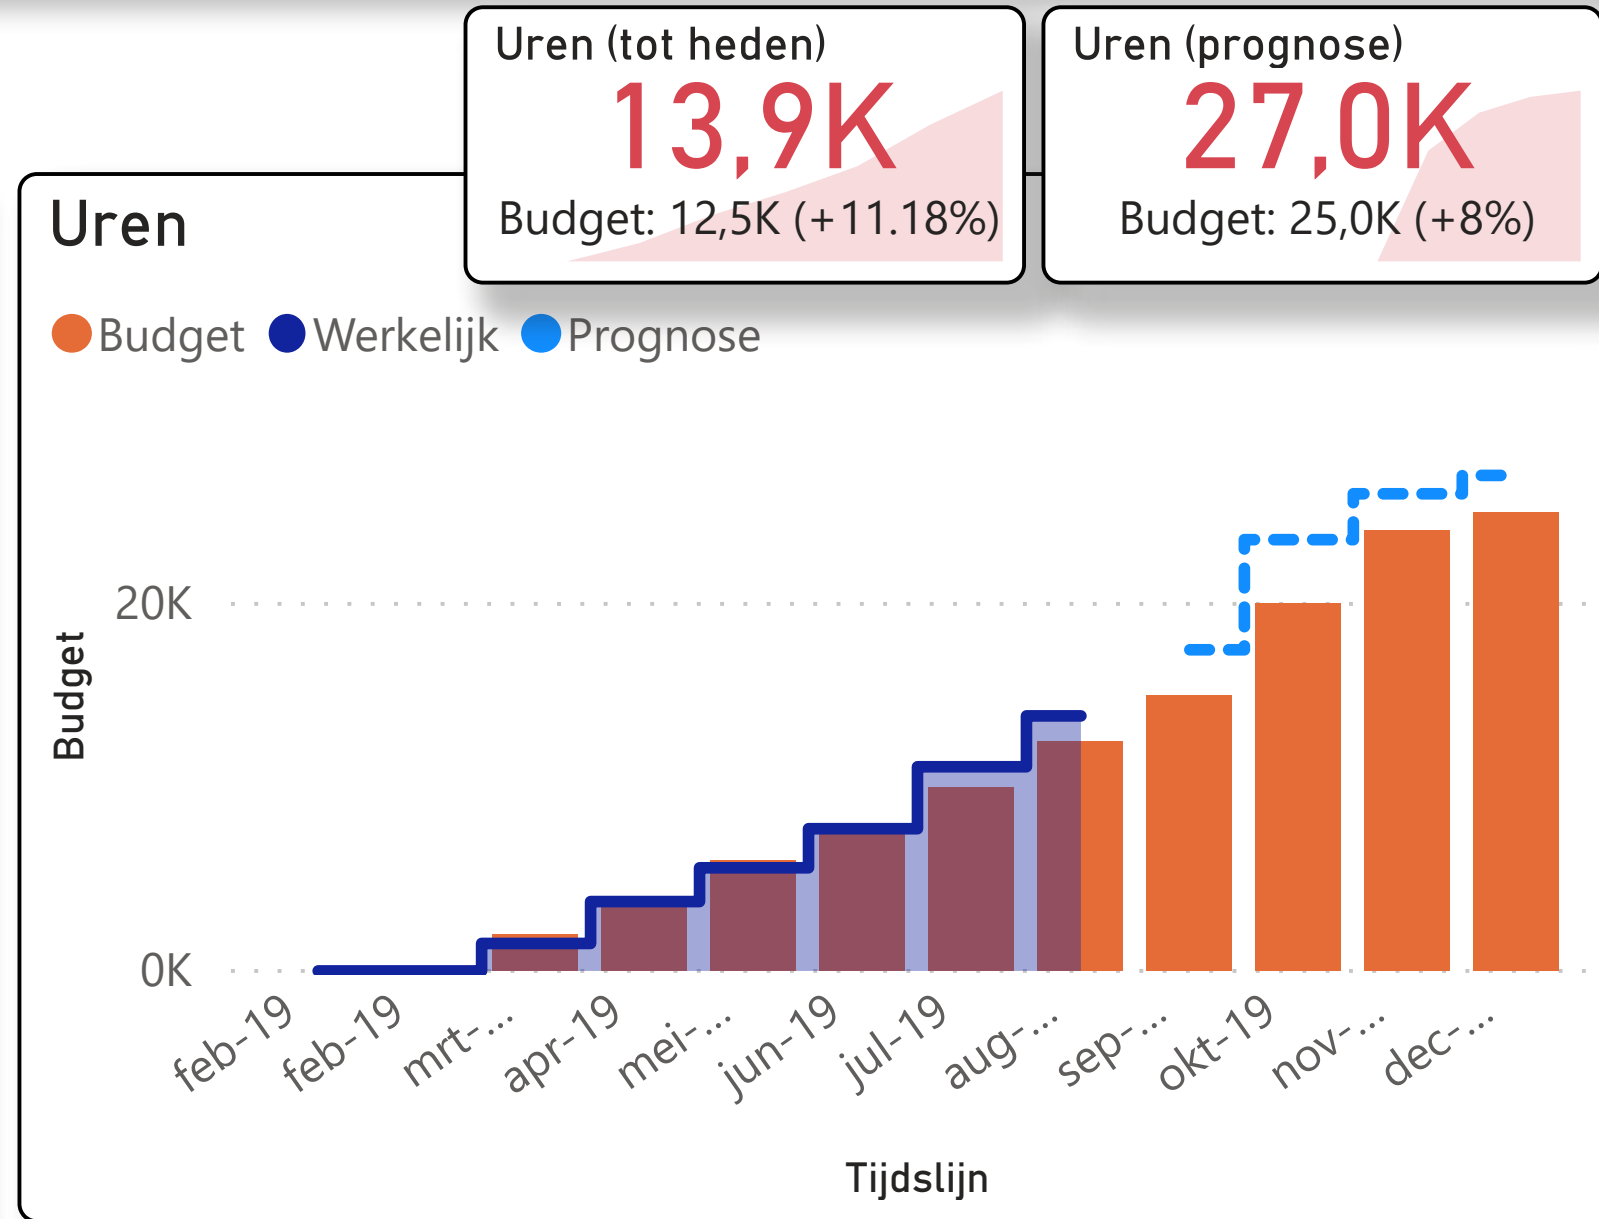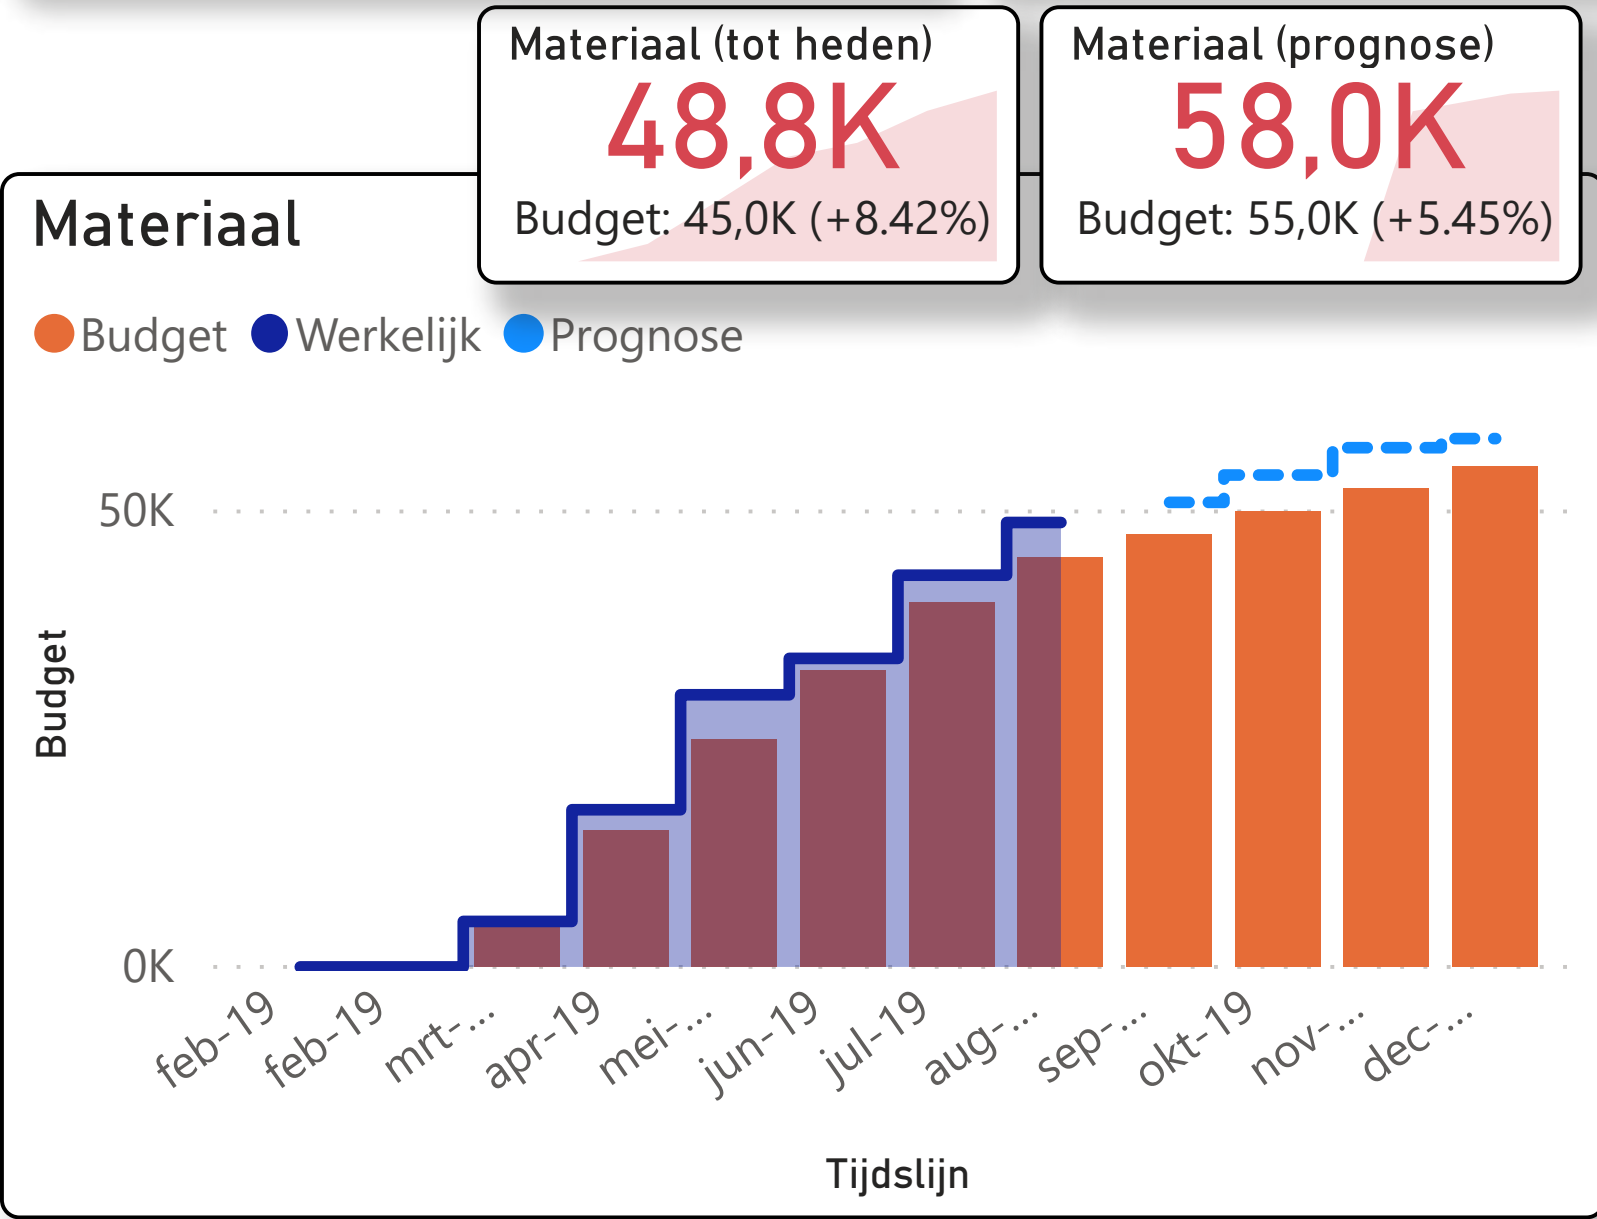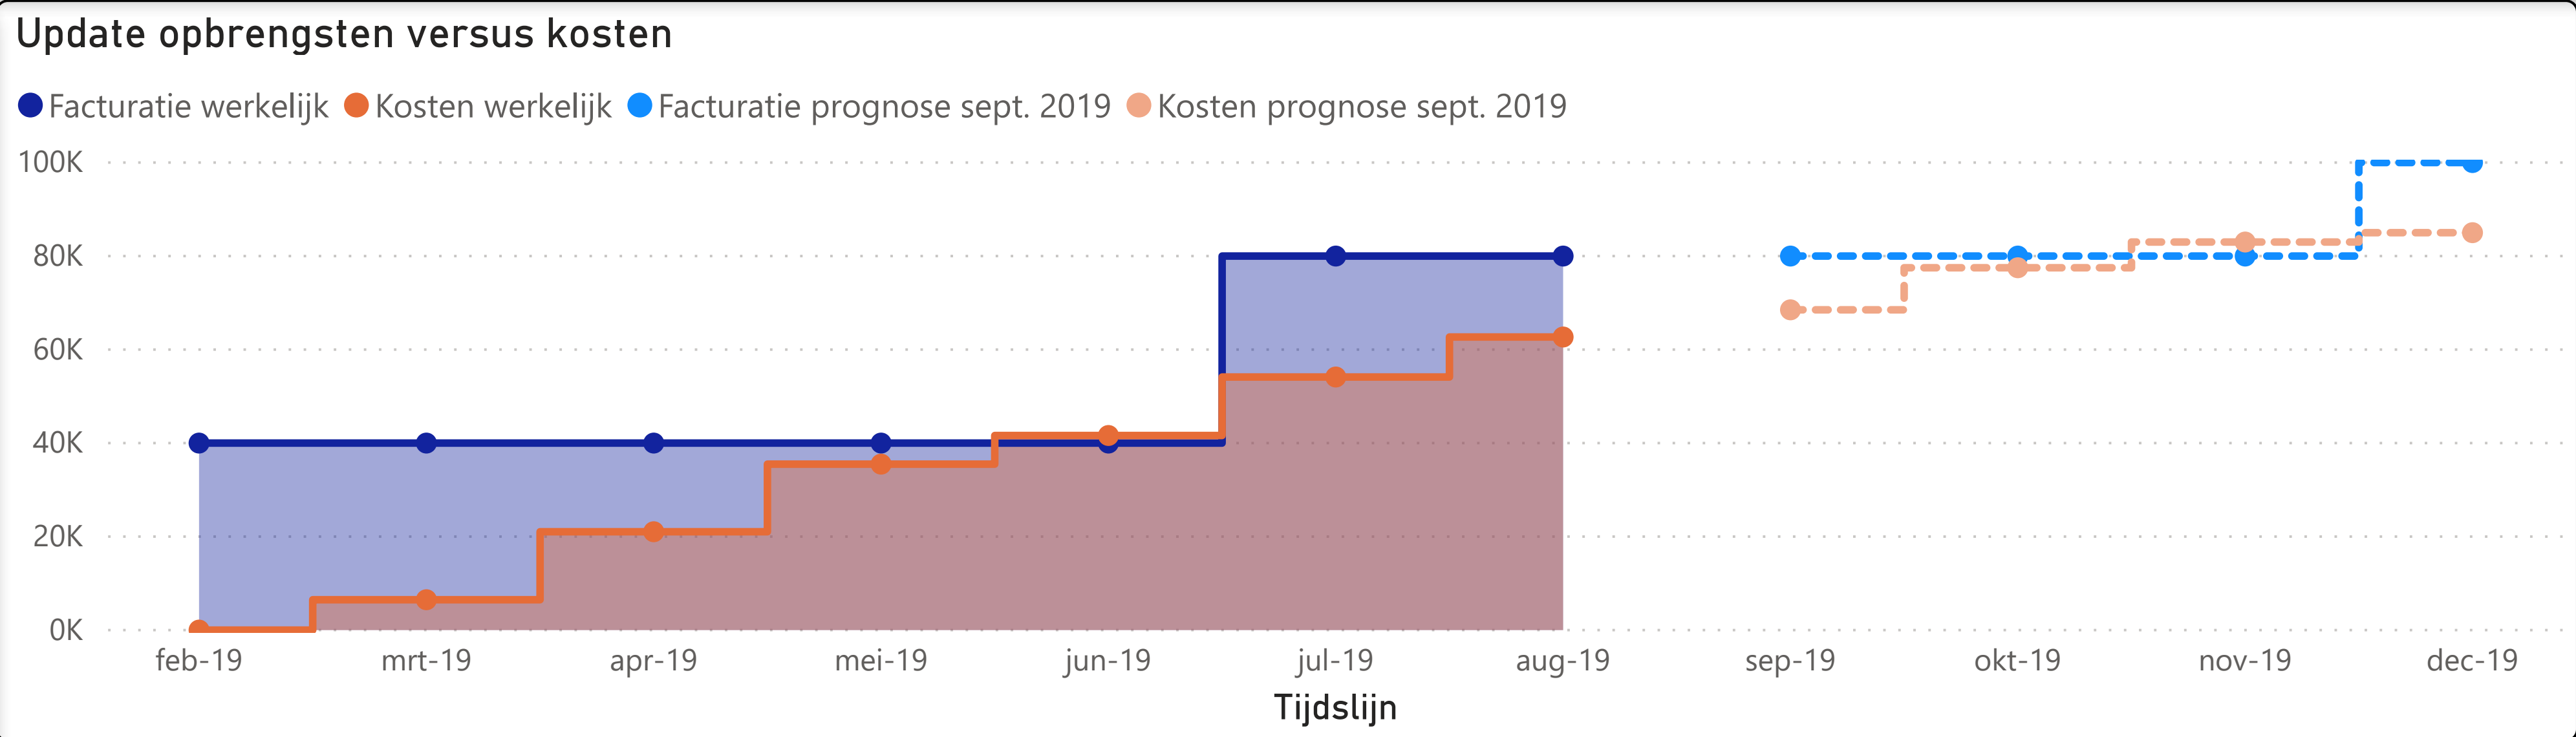

Projectrapportage

(voortgangsrapportage)

Opbrengst prognose
108,8K
Budget: 100,0K (+8.75%)

Kosten prognose
88,5K
Budget: 80,0K (+10.6%)

Marge prognose
20,3K
Budget: 20,0K (+1.35%)


Stand van zaken - afgerond

Toelichting:

- Facturatie (opbrengst) door meerwerk 7,5k hoger dan budget.
 - Geboekte kosten 8,5k hoger dan budget.
 - 5k meer materiaalkosten, 3,5k meer kosten voor personeel
 - Marge 1k onder budget.
 - Cash flow lager dan begroot.
- Kapitaalbehoefte gedurende project 3k hoger dan begroot.

Update opbrengsten versus kosten

● Facturatie werkelijk ● Kosten werkelijk

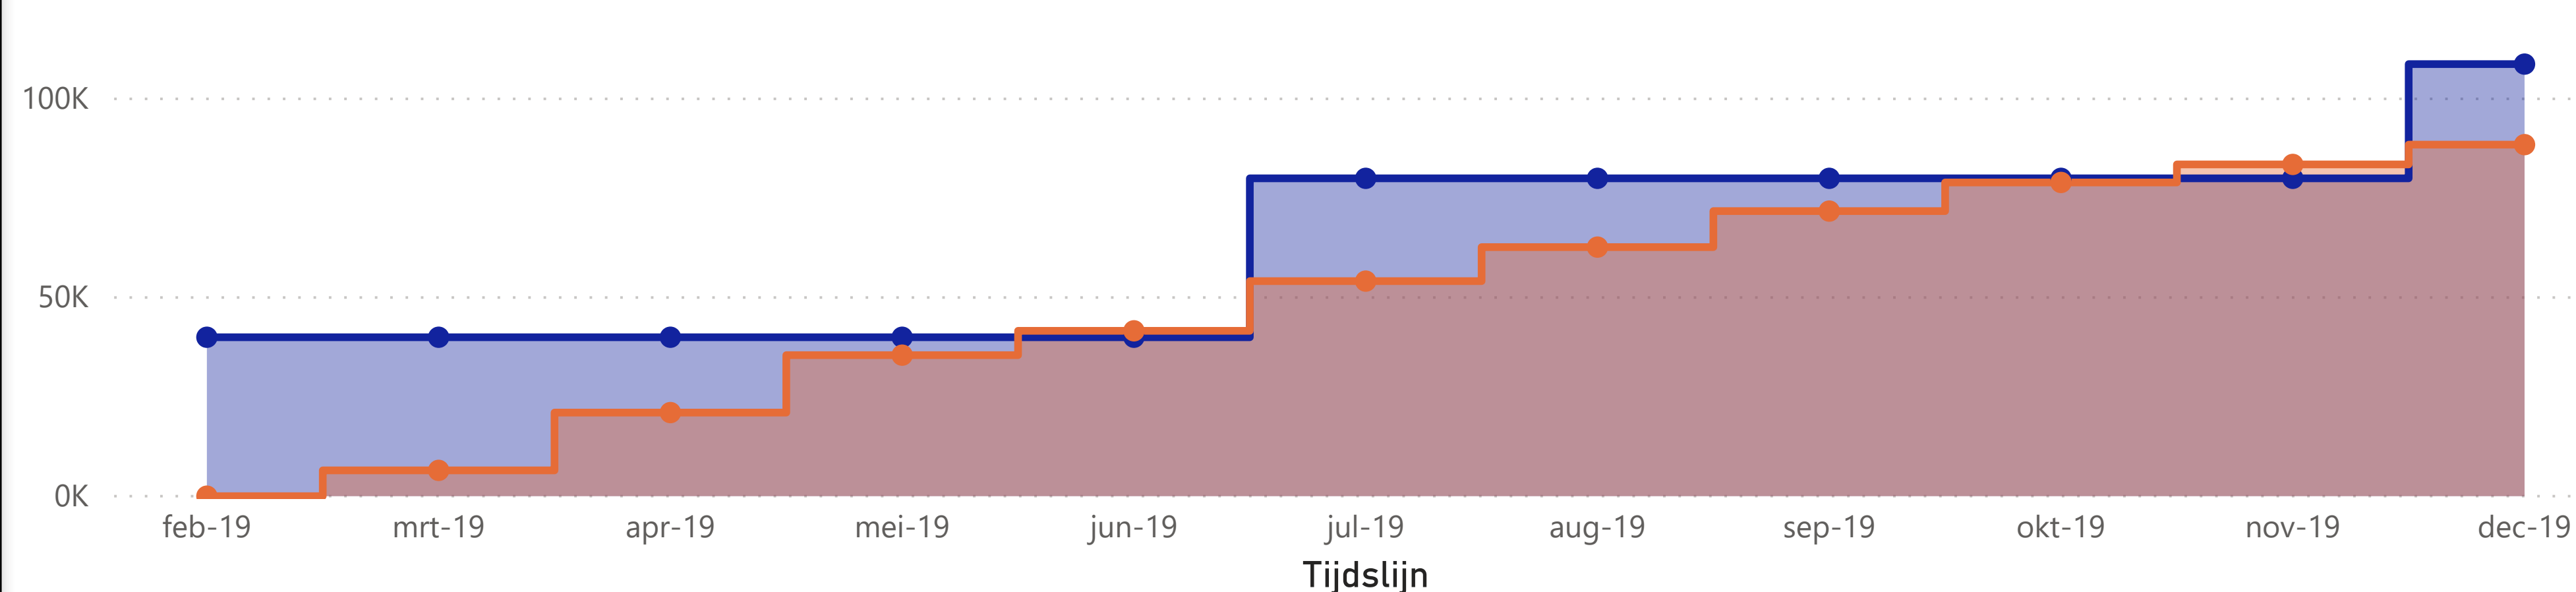

Materiaal (tot heden)

60,1K

Budget: 55,0K (+9.33%)


Materiaal (prognose)

60,1K

Budget: 55,0K (+9.33%)

Materiaal

● Budget ● Werkelijk

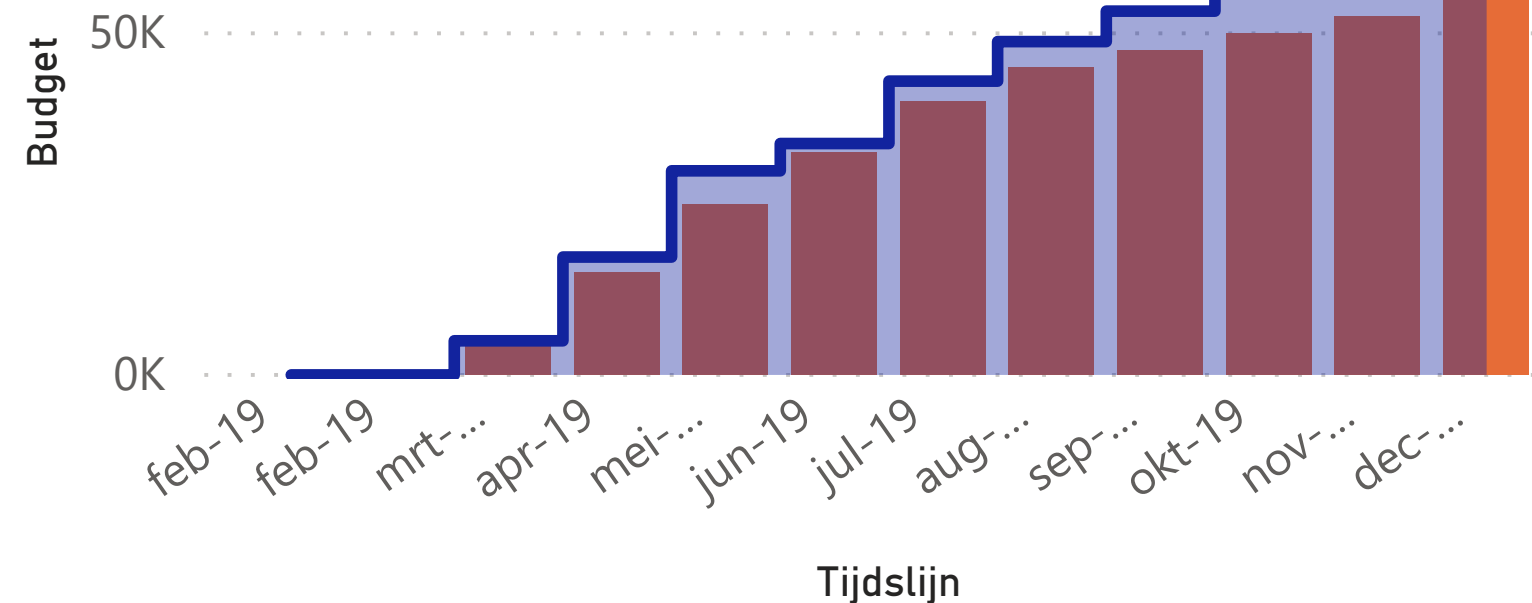

Uren (tot heden)

28,4K

Budget: 25,0K (+13.4%)


Uren (prognose)

28,4K

Budget: 25,0K (+13.4%)

Uren

● Budget ● Werkelijk

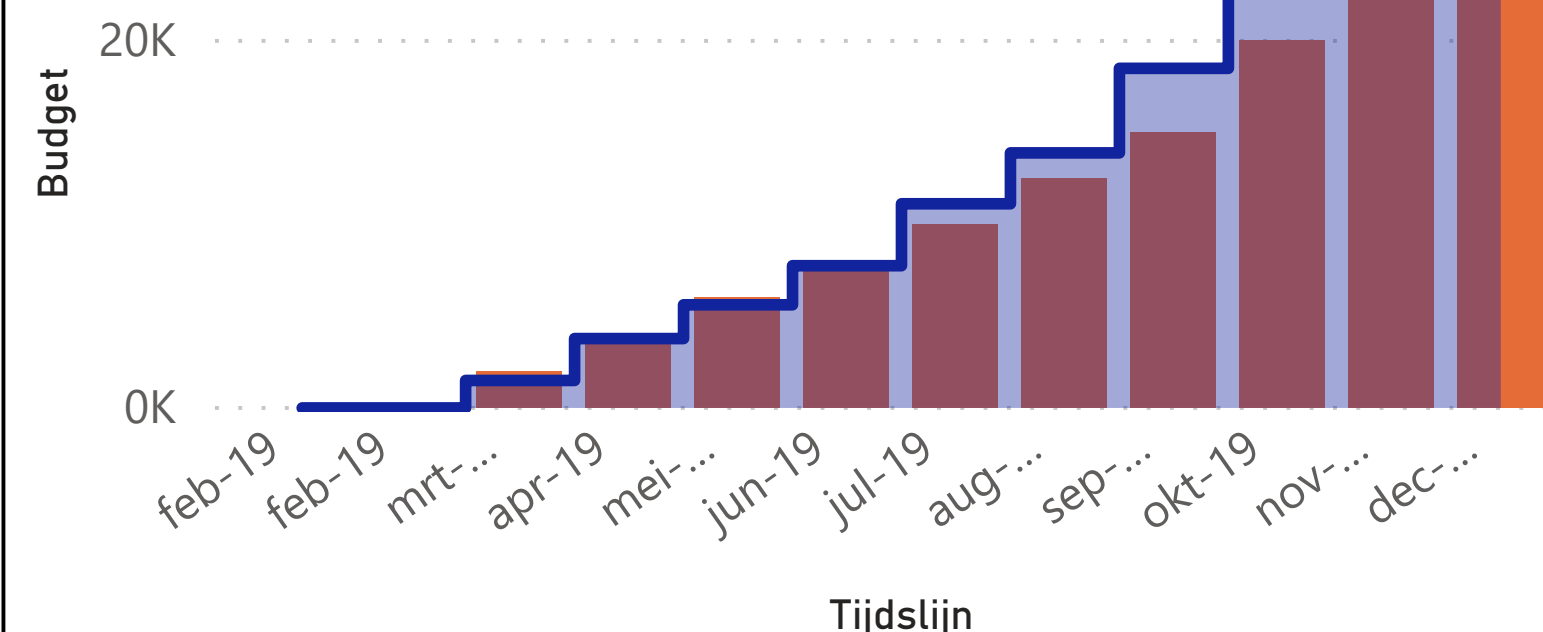

Cashflow (prognose)

20,3K

Budget: 20,0K (+1.35%)

Minimum (project)

-3,5K

Budget: -0,5K (-600%)

Kasstroom

● Budget ● Werkelijk

